

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2024년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	도로과장		이희석	☎2430	
해당없음			자체			도로시설팀장		김민재	☎2432	
					주무관		김경호	☎5696		
							천민호	☎5693		

□ 최종목표

장기 미집행 도시계획시설인 미개설된 도로개설을 통해 주민불편 해소 및 지역 균형 개발 유도

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
지속적인 도로개설을 통한 안양시 교통환경 개선	협의보상 등	공사착공, 공사준공		

□ 확인지표

- 지속적인 도로개설을 통한 안양시 교통환경 개선

□ 사업개요

(단위:백만원)

연번	공사명	사업내용	사업비	사업기간
계	6건		17,332	
1	살막삼거리선 주변 도로 구조 개선 공사	도로확장 L=60m, B=3m	400	2022. 1.~2022. 9.
2	비산3동 비산중학교 주변 도로개설	도로개설 L=62m, B=4~6m	700	2022. 1.~2022.12.
3	안양9동로 새마을교 주변 도로개설	도로확장 L=52m, B=8m	800	2022. 1.~2023. 6.
4	석수3동 충훈전원빌 주변 도로개설	도로개설 L=146m, B=6m	2,200	2022. 6.~2024.12.
5	관양2동로 자동차검사소 주변 도로개설 (3단계)	도로개설 L=129m, B=10m	7,632	2022. 6.~2024.12.
6	관양동 나우병원, 별말상당 주변 도로개설	도로개설 L=176m, B=10m	5,600	2022. 6.~2024.12.

□ 연차별 · 분기별 로드맵


세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
보상협의																	
공사착공 및 준공																	

□ 추진실적

연번	공사명	추진실적
계	6건	
1	삼막삼거리 주변 도로 구조 개선 공사	<ul style="list-style-type: none"> • '22. 6.20. : 공사 착공 • '22. 9.17. : 공사 준공
2	비산3동 비산중학교 주변 도로개설	<ul style="list-style-type: none"> • '22.10.13. : 보상 완료 • '22.11. 3. : 공사 착공 • '22.12. 1. : 공사 준공
3	안양9동 새마을교 주변 도로 개설	<ul style="list-style-type: none"> • '22. 2.22. : 인가 • '22. 4. 1. : 보상 공고 • '23. 6. 7. : 보상 완료 • '23. 6.27. : 공사 준공
4	석수3동 충훈전원빌 주변 도로개설	<ul style="list-style-type: none"> • '20. 6.29. : 인가 • '22. 5.12. : 지적(분할)측량 • '23. 6.30. : 보상 공고 • '23. 9.21.~ : 보상 협의 • '23.12. 4. : 공사 착공 • '24.12.24. : 공사 준공
5	관양2동 자동차검사소 주변 도로 개설 (3 단 계)	<ul style="list-style-type: none"> • '22. 6.28. : 인가 • '22. 7.26. : 보상 공고 • '23.10.12. : 보상 완료 • '23.12. 5. : 공사 착공 • '24.11.28. : 공사 준공
6	관양2동 나우병원, 별말성당 주변 도로 개설	<ul style="list-style-type: none"> • '22. 7.29. : 인가 • '22. 8.23. : 보상 공고 • '23.10.12. : 보상 완료 • '23.12. 6. : 공사 착공 • '24.12.12. : 공사 준공

○ 관련사진

◎ 삼막삼거리 주변 도로 구조개선 공사 완료

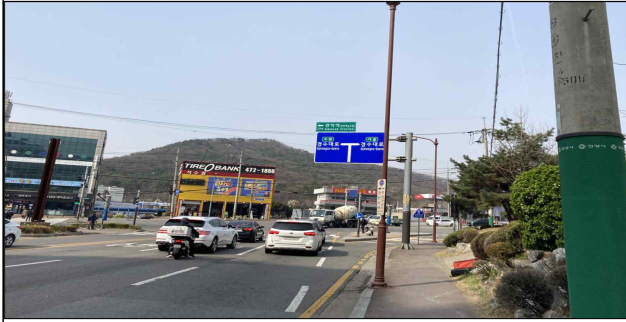


전



후

◎ 비산3동 비산중학교 주변 도로개설공사 완료

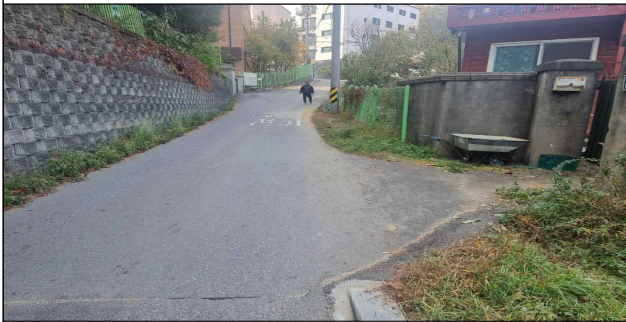

전



후

◎ 안양9동 새마을교 주변 도로개설공사 완료



전



후

◎ 석수3동 충훈전원빌 주변 도로개설공사 완료




전



후

◎ 관양2동 자동차검사소 주변 도로개설(3단계)공사 완료

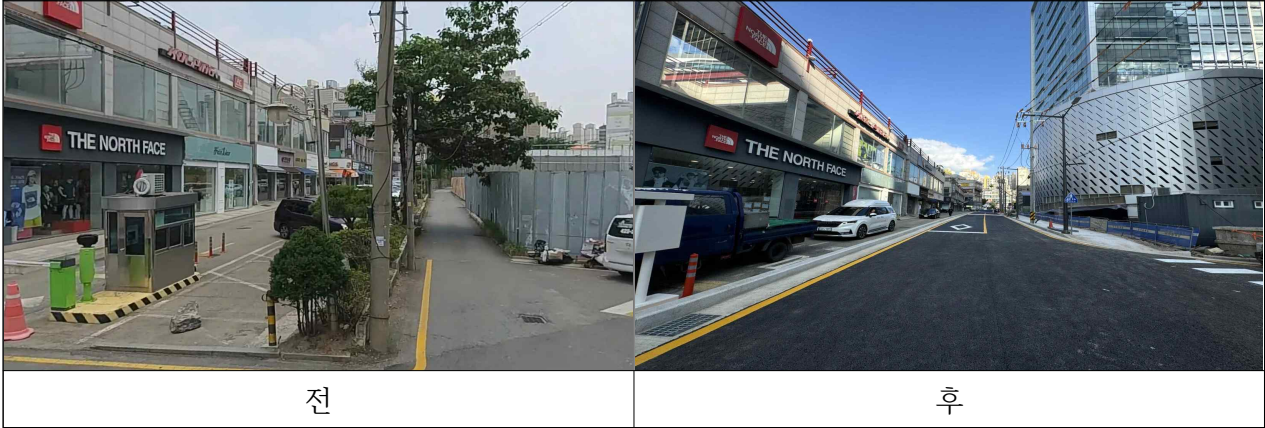

◎ 관양2동 나우병원 , 별말성당 주변 도로개설공사 완료



□ 자체 점검결과

- 삼막삼거리 주변 도로 구조개선 공사, 비산3동 비산중학교 주변, 안양9동 새마을교 주변, 석수3동 충훈전원빌 주변, 관양2동 자동차검사소 주변 (3단계) 및 나우병원·별말성당 주변 도로개설 사업 완료로 교통편의 제공

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	17,309	17,309	15,009	15,009	2,300	2,300	-	-	-	-	-	-	-
시 비	17,309	17,309	15,009	15,009	2,300	2,300	-	-	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	14,633	1,178	11,258	2,197		
시 비	14,633	1,178	11,258	2,197		
