

12-14

수암천 병목안공원 산책로 연결 및 하상개량 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2024년 6월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	생태하천과장	한현규	☎2325	
해당없음				자체			하천관리팀장	김병욱	☎2331	
							주무관	강우성	☎5164	

□ 최종목표

수암천 금용2교(안양9동)부터 병목안 시민공원까지 단절된 하천변 산책로를 연장 설치하여 하천 접근성 향상 및 하천변 친수 공간 조성

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
산책로 연결 및 하상개량	정비방향 결정 및 행정절차 이행	공사 준공	-	-

□ 확인지표

- 공사 준공(100%)

□ 사업개요


- 위치 : 수암천 공원교(병목안공원 입구)~금용2교(금용아파트 앞)(좌안)
- 공사내용
 - ▶ 산책로 설치 L=460m, B=2.5m
 - ▶ 징검다리 설치 1개소, 진입로(계단)설치 4개소
 - ▶ 하상개량 2,740㎡, 초화 식재 490㎡
- 사업기간 : 2022. 8. 1. ~ 2024. 6.
- 공사비 : 560백만원(특별조정교부금 560)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
정비방향 결정 및 행정절차 이행	■	■	■	■	■												
사업 추진						■	■	■									

□ 추진실적

- 2022. 3. 15. : 용역 착수보고회 개최
 - ☞ 참석자: 시의회(2), 시(생태하천과), 區(건설과), 洞(안양9동), 주민자치위원(4)
- 2022. 2. 14. ~ 5. 14. : 실시설계용역 추진(시예산 투입)
- 2022. 3. 3. ~ 5. 14. : 수리검토용역 추진
- 2022. 8. 1. ~ 9. 27. : 전기공사 추진
- 2022. 8. 1. : 공사 착공
- 2022. 9. 7. : 금융APT 민원접수 ☞ 산책로 및 가로등 설치 추진 반대
- 2022. 10. 7. : 금융APT 주민간담회 실시(주민17인 참석)
- 2022. 10. 17. : 공사 중지
- 2022. 11. 1. : 금융APT 사업추진 관련 입장통보[자체 투표(익명)]
 - ☞ 결과 : 찬성 57세대(37.5%), **반대 93세대(61.2%)**, 무효 2세대(1.3%)
- 2023. 1. 4. : 금융APT 입주자대표회장 면담
- 2023. 1. 5. : 안양9동 주민간담회 실시(사업지 인접APT 대상)
 - ☞ 실시사유 : 안양9동 주민의견 수렴 및 정비방향 결정
- 2023. 2. 11. : 금융APT 입주자대표회장 면담
- 2023. 2. 14. : 금융APT 민원해소(안) 제안
 - ☞ 소음 및 주민안전, 빛공해 처리예산 : 280백만원
- 2023. 2. 20. : 금융APT 추가 요구사항 접수
 - ☞ 요구사항 : 아치형다리신설, 옹벽도색, 시설물위치변경, 인접 폐가처리, 개인사유도로 폐쇄건 법적검토
- 2023. 2. 22. : 금융APT 추가 요구사항 검토의견 회신
 - ☞ 검토의견 : 수용(시설물위치변경), 소관부서 전달(폐가처리), 이 외 수용불가
- 2023. 2. 25. : 금융APT 주민간담회 실시(주민25인 참석)
- 2023. 3. 6. : 市제안 금융APT 수용여부(사업추진) 입장통보[자체투표(기명)]
 - ☞ 결과 : 찬성 55세대(37.4%), **반대 92세대(62.6%)**
- 2023. 3. 22. : 변경추진 결정(내부방침) 및 공약사업 변경 심의 상정(정책기획과)
 - ☞ 변경추진(안) : 퇴적토 준설 및 하상안정화 정비
- 2023. 3. 23. : 예산사용 용도변경 신청(예산법무과) 및 경기도 예산부서 현장점검
 - ☞ 변경 : 수암천 병목안공원 산책로 연결공사 → 수암천 병목안공원 주변 하상정비 공사
- 2023. 3. 28. : 공약사업 세부시행계획 변경 심의(조건부가결)
- 2023. 4. 3. : 홍화APT 민원접수(산책로 설치 원안 추진)
- 2023. 4. 7. : 홍화APT 민원회신 ☞ 답변내용 : 사업계획 변경 추진
- 2023. 4. 17. : 국민권익위원회 고충민원 이송(산책로 설치 원안 추진)
- 2023. 5. 11. : 특별조정교부금 용도변경 승인통보(경기도)
- 2023. 5. 25. : 수암천 주변 지역 주민간담회 실시(시민원옴부즈만 주관)
- 2023. 6. 8. : 금융APT입주자대표회장 면담(시민원옴부즈만 주관)
- 2023. 7. 1. : 금융APT입주민 간담회 실시(시민원옴부즈만 주관)
- 2023. 8. 11. : 만안구 주민 간담회 실시(시민원옴부즈만 주관)
- 2023. 8. 28. : 민원옴부즈만 권고사항 통보
- 2023. 9. 20. : 추진방향 결정(내부방침) 및 예산사용 용도변경 신청(예산법무과)
- 2023. 10. 26. : 특별조정교부금 용도변경 승인 통보(2차변경)
- 2023. 11. 30. : 공사 계약 해지
- 2023. 12. 21. : 제4회 추경예산 재편성 (L=170m)
- 2024. 3. 29. : 공사 재착공(470m 전 구간 조성)
- 2024. 6. 26. : 공사 준공 및 개통

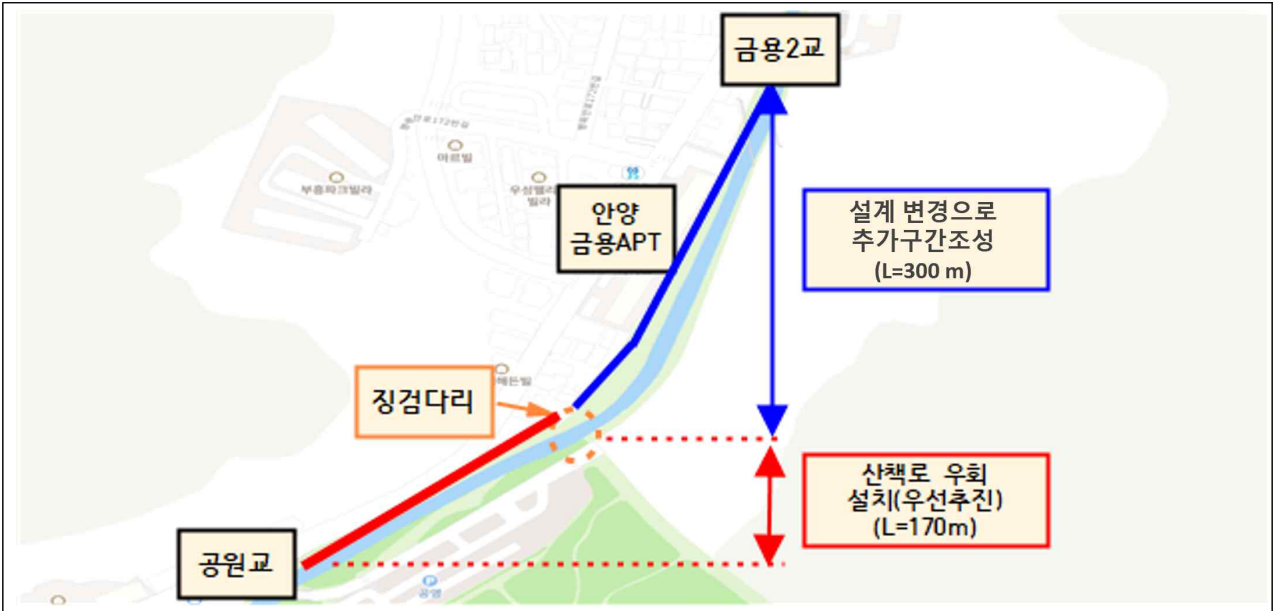

위 치 도(절충안)



공사전



공사후



주민간담회 및 면담 실시

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 민원해소 및 주민소통을 위해 주민간담회 및 면담 등 실시(14회)

【미흡한 점】

- 사업 추진 전 사업지 인접 아파트 소통 부족으로 집단 민원 발생

【개선계획】

- 일부 주민(금융아파트 반대) 민원 해소될 시 원안대로 산책로가 공원2교에서 공원교(병목안공원 입구)까지 연결되도록 추진할 계획임.

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	790	790	790	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	750	750	750	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	668	135	-	533	-	-
도비	95	95	-	0	-	-
시비	573	40	-	533	-	-

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
14	-	-	-	-	-

- ▶ 2022. 10. 7. ~ 2024. 3. 20. : 주민간담회(6회) 및 면담(8회) 실시

☞ 주민의견 청취 및 사업추진 반대 주민 설득
