

12-19

시민 편의를 우선으로 하는 인도 개선 및 횡단보도 설치

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산	○						100%	2025년 12월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	철도교통과장		이준표	☎2310
해당없음				자체			교통정책팀장		전경훈	☎2807
							주무관		오혜림	☎2175

최종목표

호계1동 평촌어바인퍼스트 1·2단지 주출입로와 연결되는 경수대로 접속지점에 횡단보도 설치를 통하여 주민 보행불편 해소

연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
횡단보도 설치	주변도로 교통패턴 검토	주변도로 교통패턴 검토 / 교통체계개선(안) 수립	교통안전심의위원회 재상정 (동안경찰서 협의) / 횡단보도 설치*	-

*교통안전심의위원회 심의 가결 시

확인지표

- 횡단보도 설치공사 완료 및 개통

사업개요

- 사업기간 : 2025. 10. ~ 12.
- 위치 : 호계동 평촌어바인퍼스트 1·2단지 앞 (도로명 : 경수대로)
- 사업내용 : 횡단보도 및 신호등 설치
- 사업목적
 - ▶ 경수대로를 중심으로 평촌어바인퍼스트(서측)에서 호계시장, 대중교통 이용 등 건너편(동측)으로 이동에 대한 보행불편 해소

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
주변도로 교통패턴 검토																	
교통체계개선(안) 수립																	
교통안전심의위원회 재상정 (동안경찰서 협의)																	
횡단보도 설치																	


□ 추진실적

- 2018. ~ 2021. 동안경찰서 교통안전심의위원회 심의 [결과 : 부결]
- 2021. 11. : 관계기관 교통민원 합동 현장진단
 - ▶ 주관: 경기도남부자치경찰위원회
 - ▶ 참석: 안양시, 경기남부경찰청, 동안경찰서, 도로교통공단, 도의원(국중현), 시의원(이채명, 김필여), 지역주민
- 2023. 11. : 관계기관 합동 현장점검
 - ▶ 참석 : 안양시, 동안경찰서, 도로교통공단
- 2024. 3. : 도로교통 효율화 분석사업(기술용역) 수요조사 및 대상지 선정

☞ 도로교통 효율화 분석사업(기술용역) 개요

- ▶ 발주기관 : 경기도남부자치경찰위원회
- ▶ 용역기간 : 2024. 3. ~ 11월
- ▶ 주요내용 : 교통공학 분석필요 구간에 대한 전문분석 지원
 - 현황조사 및 분석(교통환경, 교통특성, 서비스 수준 분석 등)
 - 교통개선안 수립(차로 및 교통신호운영 개선안, 교통안전시설 설치 방안 검토, 교통처리계획 수립 등)

- 2024. 4. : 기술용역 실시 전 현장조사 및 개선방향 모색 사전협의
- 2024. 9. : 기술용역 검토 보고서(초안) 접수 및 검토의견 회신
- 2024. 11. : 교통체계개선(안) 수립 완료(경기도남부자치경찰위원회)
- 2025. 2. : 사업비 확보 관련 특별조정교부금 대상사업 신청
- 2025. 5. : 안양동안경찰서 교통안전심의위원회 심의 [결과 : 가결]
- 2025. 8. : 특별조정교부금 교부
- 2025. 9. : 실시설계용역 착수
- 2025. 9. : 2025년 제3회 추경예산 편성
- 2025. 10. : 도로관리심의회 서면심의 의결
- 2025. 10. : 안양시·동안경찰서 합동 교통안전대책 협의
- 2025. 10. : 공사 착공
- 2025. 11. : 사전 홍보
- 2025. 12. : 공사 준공

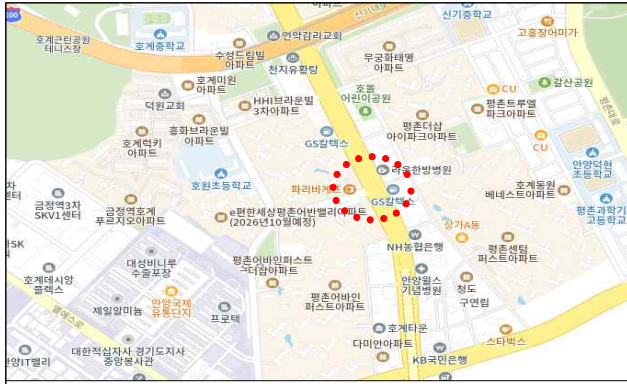

위 치 도



현 장 사 진

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 교통안전심의위원회 가결
 - ▶ 과거 3회 부결되었으나, 우리시 개선방안 고려하여 최종 가결
- 소요사업비 확보(2025년 특별조정교부금)

【개선계획】

- 교통 모니터링 및 최적 신호운영체계 수립

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	320	320							320	320			
국 비													
도 비	320	320							320	320			
시 비													
기 타													

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	-	-	-	1

- ▶ 2025. 5. 9. : 교통안전심의 당시 현장간담 및 주민의견 청취

□ 향후 추진계획

- 2026. 1.: 관할경찰서 협의 및 횡단보도 개통 추진
