

15-2

## 석수체육관 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산	○						100%	2025년 7월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	체육과장	송기찬	☎5910	
필요 (재정)				자체			체육시설팀장	이인수	☎2146	
							주무관	박창은	☎2695	

### □ 최종목표

실내체육관(수영장 포함)을 건립하여 주민 생활체육 활성화에 기여

### □ 연차별 목표

구분	2019년	2020년	2021년	2023년~2024년	2025년
석수체육관 건립	타당성 조사용역	지방재정 투자심사	설계공모 및 실시설계용역	착공	준공

### □ 확인지표

- 실내체육관(수영장 포함) 건립공사 착공 및 준공

### □ 사업개요

- 위치 : 만안구 석수동 279-38, 39번지  
(석수2동 행정복지센터 옆 공영주차장 부지)
- 부지면적 : 2,407.1㎡
- 규모 : 연면적 7,932.15㎡, 지하2층/지상5층
- 용도 : 체육시설(수영장 25m×4레인, 다목적체육관), 뉴딜사업  
▶ 뉴딜사업 : 도시재생 기반시설 사업
- 소요예산 : 360억원(국비 30, 도비 78, 시비 252)
- 사업기간 : 2019. 6. ~ 2025. 7.


### □ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기 후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
타당성조사 용역	■																
지방재정중앙투자심사	■																
설계공모 및 실시설계 용역	■	■	■														
공사착공·준공				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			


□ 추진실적

- 2019. 6. 19. ~ 11. 15. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2019. 12. 16. : 지방재정 투자심사(중앙) 신청
- 2019. 12. 20. : 공유재산 관리계획 반영
- 2020. 1. 9. : 21년 체육진흥시설 지원 사업(균특회계) 신청
- 2020. 8. 11. : 지방재정 투자심사 재신청(3차)
- 2020. 11. 4. : 지방재정 투자심사 통과
- 2021. 7. 1. : 설계공모 완료
- 2021. 7. 30. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 9. 8. : 공용건축물 협의 완료
- 2022. 9. 30. : 주민설명회 개최
- 2022. 10. 17. : 설계용역 최종보고회 개최
- 2022. 11. 24. : 설계용역 완료
- 2022. 12. 28. : 건설사업관리 용역 공고(감리)
- 2023. 3. 6. : 시공사 선정 공고
- 2023. 4. 4. : 시공사 선정
- 2023. 4. 28. : 착공
- 2025. 7. 9. : 준공(건축) ※ 사용승인일 : 2025. 8. 21.
- 2025. 11. 18. : 석수체육센터 개관식 ※ 임시개관 : 2025. 12. 8.


□ 사진 자료

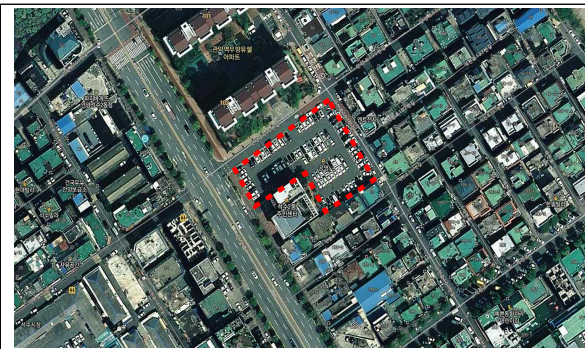


위치도

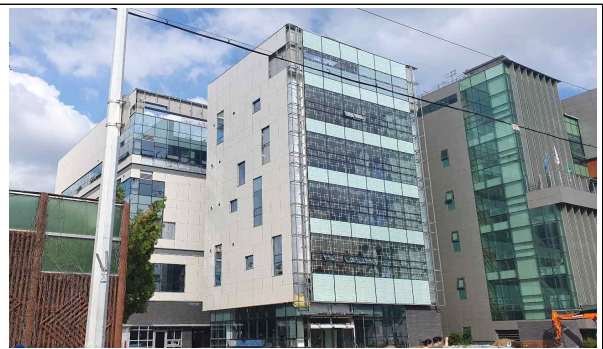

현장 사진

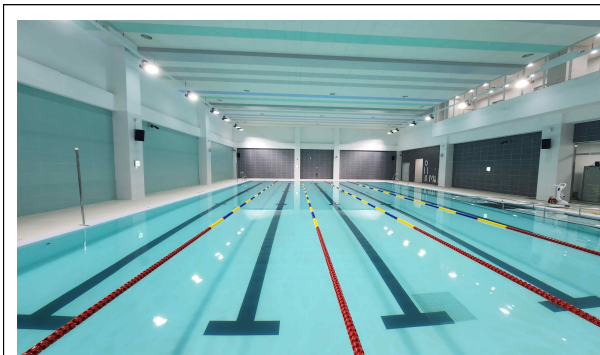

내부사진(수영장)

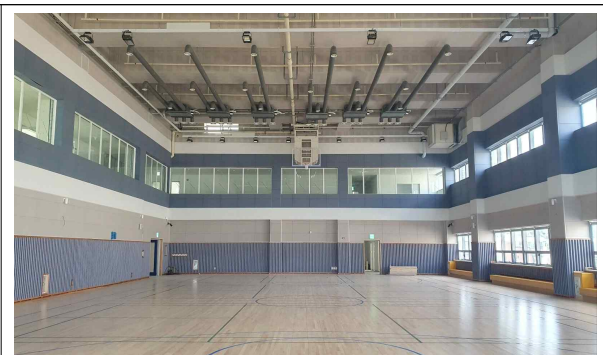

내부사진(다목적체육관)

□ **자체 점검결과**

- 지역균형 발전 및 생활체육 활성화 기여

□ **중앙정부, 경기도 등 타기관의 도움(제도, 재정, 권한) 필요 사항**

- 2024년도 체육진흥시설 지원사업 도비 40억 교부결정

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2021		2022		2023		2024		2025		2026		임기 후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	36,057	36,057	3,000	3,000	6,600	6,600	9,111	9,111	10,269	10,269	7,077	7,077	-	-	-
국비	3,030	3,030	3,000	3,000	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	7,401	7,401	-	-	-	-	3,400	3,400	4,001	4,001	-	-	-	-	-
시비	25,626	25,626	-	-	6,570	6,570	5,711	5,711	6,268	6,268	7,077	7,077	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2021	2022	2023	2024	2025	2026
계	32,544	842	792	3,284	9,110	18,516	0
국비	3,029	800	792	1,437	0	0	0
도비	7,401	0	0	0	6,351	1,050	0
시비	22,114	42	0	1,847	2,759	17,466	0
기타	0	0	0	0	0	0	0

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
3	1	-	1	-	-

- ▶ 2019. 8. 19. ~ 8. 25. : 석수체육관 건립 시민의견 조사
- ▶ 2019. 10. 11. : 석수체육관 건립 기본계획(안) 주민설명회
- ▶ 2023. 5. 2. : 석수체육관 건립 착공 보도



[ 사진 ] 2019. 10. 11. : 석수체육관 건립 주민설명회



[ 사진 ] 2022. 9. 30. : 석수체육관 건립 주민설명회(최종)

□ **향후 추진계획**

- 2026. 4. : 석수체육센터 정식 개관
