

11-11

거점별 청소년 문화센터 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산	○						100%	2024년 11월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	교육청소년과장	김혜영	☎2240	
해당없음			자체				청소년팀장	박진영	☎2205	
							주무관	장정윤	☎5598	

최종목표

거점별 청소년 문화센터를 건립하여 지역 간 균형있는 청소년시설 확충

연차별 목표

구분	2022년	2023년	2024년	비고
청소년 문화센터 건립	착공	공사진행	준공 및 개관	

확인지표

- 권역별 청소년 문화센터 건립

사업개요

- 박달청소년문화의집 건립
 - ▶ 위치 : 만안구 박달로 440 (舊 박달2동 행정복지센터 부지)
 - ▶ 면적 : 연면적 990.76㎡(부지면적 699㎡)
 - ▶ 규모 : 지하1층, 지상4층
 - ▶ 총사업비 : 5,226백만원(도비확보액 : 3,148백만원)
 - ▶ 주요시설 : 청소년카페, 노래방, 1인 미디어실, 방과후아카데미 등

층별	면적(㎡)	용도
지상	4층	235.87(71평) 댄스연습실, 스튜디오, 다목적실, 휴게공간
	3층	258.78(78평) 방과후 아카데미, 청소년운영위원회실, 노래방, 동아리휴게공간
	2층	240.59(73평) 디자인메이커실, 1인 학습공간, 인터넷존, 사무실
	1층	164.42(50평) 청소년카페, 게임존, 주차장
지하	1층	91.10(28평) 기계실, 창고


- 관양청소년문화의집 건립 (※시설건립 추진부서 : 복지정책과)
 - ▶ 위치 : 관양동다목적복지회관 2층(관양동 1703번지)
 - ▶ 면적 : 연면적 810㎡
 - ▶ 주요시설 : 노래방, 게임존, 음악연습실, 댄스연습실 등

□ 연차별 · 분기별 로드맵


세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
설계 및 착공																	
준공 및 개관																	
완료 후 지속 추진																	

□ 추진실적 [박달청소년문화의집 건립공사]

- 2019. 9. 청소년 문화의집 건립 기본계획 수립
- 2019. 12. 중기지방재정계획 반영, 공유재산관리계획 승인
- 2020. 3. 재정계획심의위원회 용역과제 심의완료, 박달청소년문화의집 건립심의위원회 구성
- 2020. 4. 지방재정투자사업 승인(경기도)
- 2020. 7. 박달청소년문화의집 건립심의위원회 개최
- 2020. 8.~9. 지역청소년 여론조사완료
- 2021. 2. 공공건축지원센터 사전검토 심의, 경계복원 측량
- 2021. 3. 석면철거공사, 지반조사 실시, 청소년메이커센터 벤치마킹
- 2021. 4. 안양시공공건축심의위원회심의, 박달청소년문화의집 건립심의위원회개최,살별활용계획심의
- 2021. 5.~8. 설계공모 및 선정
- 2021. 9. 설계용역 착수
- 2022. 2. 주민설명회 개최
- 2022. 8. 감독 권한대행 및 통합건설사업관리용역 계약
- 2022. 9. 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2022. 12. 공사착공(건축, 기계, 토목)
- 2023. 1.~3. 공사중지(동절기 휴한)
- 2023. 3.~5. 철거공사
- 2023. 4~5. 공사착공(소방,전기,통신)
- 2023. 8~10. 청소년재단 조직개편 및 인력증원 추진
- 2024. 1.~2. 공사중지 (동절기 휴한) ※ 2024. 2. 26. 공사재개
- 2024. 8.12. 공사 준공
- 2024. 11. 개관 (박달청소년문화의집: 11.2, 관양청소년문화의집: 11.7.)

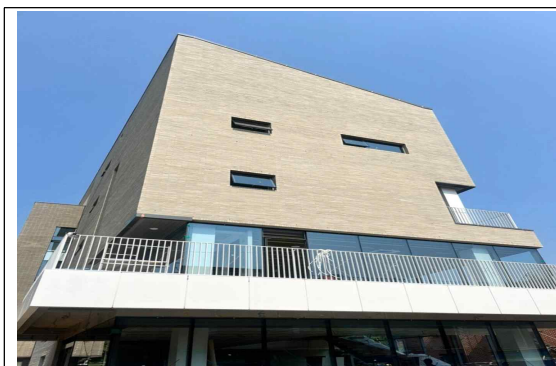

박달청소년문화의집

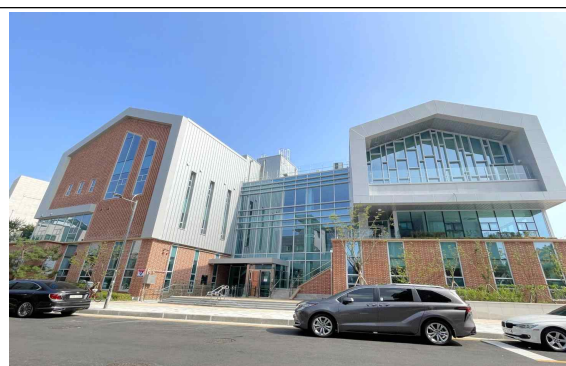

관양청소년문화의집(다목적복지회관)

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 예산확보를 위한 사전절차 및 의견수렴, 각종 사업 계획 심의 이행
- 주민설명회를 통한 주민 의견 수렴 및 건의 사항 설계반영 노력

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2020~2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	5,226	5,226	2,869	2,869	2,357	2,357	-	-	-	-	-	-	-
도 비	3,148	3,148	1,498	1,498	1,650	1,650	-	-	-	-	-	-	-
시 비	2,078	2,078	1,371	1,371	707	707	-	-	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2021~2022	2023	2024	2025	2026.6
계	4,962	598	853	3,486	25	-
도 비	3,148	417	539	2,192	-	-
시 비	1,814	181	314	1,294	25	-

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
1	2	-	13	25	4

- ▶ 박달청소년문화의집 건립심의위원회 개최(3회)
- ▶ 박달청소년문화의집 건립관련 여론조사 실시(2020. 8 ~ 9월, 비대면)
- ▶ 박달청소년문화의집 주민설명회 개최(2022. 2월)
- ▶ 관양청소년문화의집 건립관련 여론조사 실시(2022. 8 ~ 9월, 비대면)

○ 시민소통 계획

- ▶ 인스타, 페이스북 등 SNS를 통해 개관 및 운영계획 홍보
- ▶ 인근 학교 및 주민 대상으로 지속 홍보 예정

□ 향후 추진계획

- 2024. 11. ~ 박달·관양 청소년문화의집 운영
