

15-6

[유소년] 풋살 전용 경기장 건립

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	비예산			○				40%	2027년 3월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	체육과장 체육시설팀장 주무관	송기찬 이인수 박창은	☎5910 ☎2146 ☎2695	
해당없음			자체							

□ 최종목표

유소년 전용 풋살장을 건립하여 주민 생활체육 활성화에 기여

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
유소년 풋살장 건립	도시계획시설 실시계획인가	도시계획시설 실시계획변경 및 토지보상 협의	토지보상 (수용재결 등)	공사착공	공사준공

□ 확인지표

- 석수 안양천 체육공원 사업 내 풋살 경기장 건립

□ 사업개요


- 사업기간 : 2019. 2. ~ 2027. 3.
- 사업위치 : 만안구 석수동 555-5번지 일원(석수 안양천 체육공원 사업부지)
- 소요예산 : 경기도 도시공사에서 추진하는 훼손지 복구사업으로 조성
- 사업내용 : 풋살장, 다목적 잔디구장 등

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
도시계획시설 인가																	
토지보상 및 관계기관 협의																	
공사착공 · 준공																	

□ **추진실적**

- 2019. 2. 19.: 개발제한구역 해제 결정고시(경기도고시제2019-39호)
- 2021. 7. 9.: 도시계획시설 및 공원조성계획 결정(안) 신청
- 2021. 10. 5.: 주민공람·공고
- 2021. 12. 21.: 시의회 의견청취
- 2022. 2. 16.: 도시계획위원회 심의
- 2022. 3. 11.: 도시관리계획(공원) 및 공원조성계획 결정 고시
- 2022. 12. 22.: 도시계획시설 실시계획인가 신청
- 2023. 9. 25.: 도시계획시설 실시계획인가
- 2024. 2. .: 토지보상
- 2024. 7. 23.: 체육공원 공원조성계획(변경) 결정 협의
- 2024. 12. 30.: 도시계획위원회 심의(변경안)
- 2025. 2. 6.: 공원조성계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 2025. 4. 14.: 개발행위허가(신축 및 토지형질변경) 신청

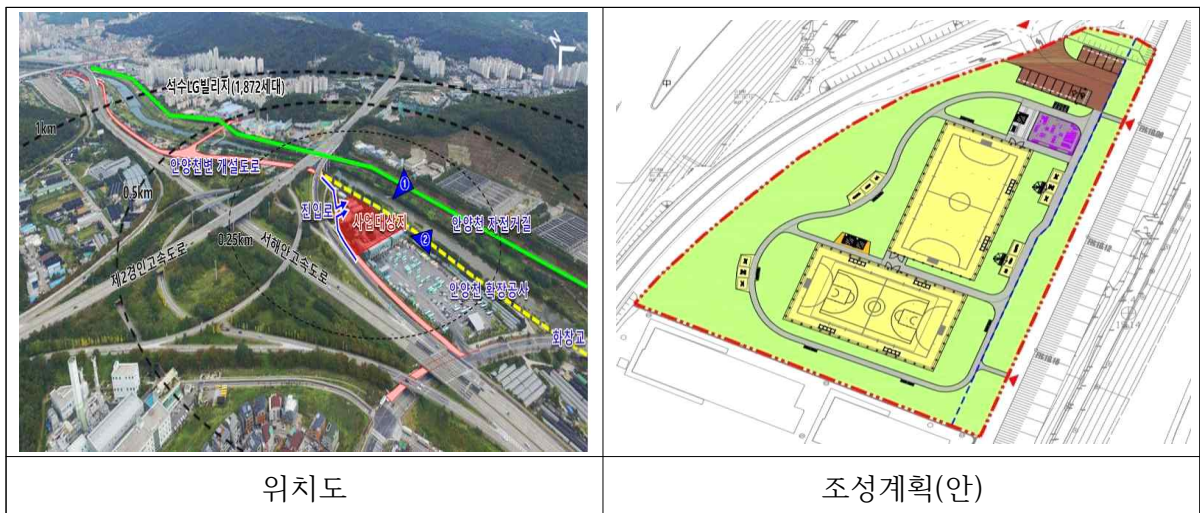

□ **자체 점검결과**

- 유소년 전용 풋살장을 건립하여 주민 생활체육 활성화에 기여

□ **연차별 투자계획 및 집행 : 해당없음**

※ 관양고 주변 개발제한구역 해제에 따른 훼손지 복구사업 일환으로 실시되는 사업임.

- 경기도 도시공사에서 훼손지 복구사업의 일환으로 추진 중인 석수 안양천 체육공원 조성사업은 가용토지가 부족한 우리 시의 경우 가용토지 확보 및 사업예산 없이 조성되는 사업임.

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	-	-	-	3

- ▶ 2018 훼손지 복구계획 체육공원 내 시설 종류에 대해 설문지 조사
- ▶ 도시계획시설 결정(변경) 주민공람

□ **향후 추진계획**

- 2026. 1. : 중앙토지수용위원회(이의재결) 심의 개최 예정
 - ▶ 2025. 12. 19. : 토지주 민원 신청에 따라 중토위 심의 연기
- 2026. 3. : 토지·지장물 등 보상 완료
- 2026. 5. : 공사착공
- 2027. 3. : 공사준공
