

3-13

호계시장 인근 지하주차장 조성

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	비예산	○						100%	2024년 10월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	철도교통과장 주차정책팀장 주무관	이준표 강연진 김완중	☎2310 ☎2295 ☎5645	
해당없음				자체						

□ 최종목표

호계시장 주변지역의 주차난 해소를 위해 덕현지구 재개발사업조합에서 지하주차장을 조성하여 우리시로 기부채납

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
공영주차장 조성	공사 착공	공사 준공	-	-

□ 확인지표

- 공영주차장 조성 후 기부채납

□ 사업개요


- 사업기간 : 2021. 10. ~ 2024. 10.
- 위치 : 호계동 1002-22번지 일원
- 면적 : 부지면적 약 5,986㎡/ 연면적 : 약 5,092㎡
- 시설규모 : 지하2층, 주차면 125면

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역																	
공사																	

□ **추진실적**

- 2021. 10. : 실시설계용역 착수
- 2022. 8. : 실시설계용역 준공 및 건축허가
- 2023. 6. : 공사 착공(덕현지구 재개발정비사업 조합)
- 2024. 9. : 임시사용승인에 따른 주차장 개방
- 위치도 및 조감도

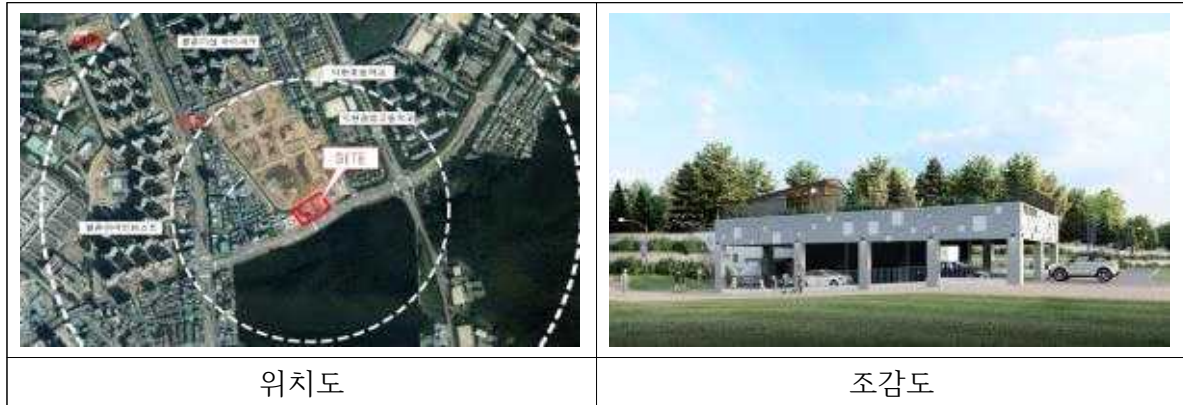

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 조합과의 협의를 통해 공영주차장을 기부채납 받아 市 예산 절감

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 계획
 - ▶ 조합에서 추진하는 사업으로 정비계획 결정(변경) 등 공영주차장 구성에 대해 고시하였으며, 준공 및 개통 시 언론에 홍보할 예정임

□ **향후 추진계획**

- 2024. 10. : 공사 준공 및 기부채납
