

8-5

전통시장 노후 아케이드 개선

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산		○					100%	2023년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	기업경제과장	김성대	☎2100	
해당없음			자체				경제정책팀장	이향례	☎2271	
							주무관	전홍진	☎5885	
							주무관	채희창	☎2563	

□ 최종목표

노후화(중앙시장 아케이드 지붕막 등) 아케이드를 개선하여 쾌적한 전통 시장 환경 조성 및 편의 증진

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
시설점검 및 현장확인	주 3회	주 3회	주 3회	주 3회
노후시설 교체 및 지원	1회	1회	1회	1회
전통시장 시설현대화 사업	중앙시장 아케이드 지붕막 교체	중앙시장 아케이드 빗물받이 보수공사	교체시기 도래 시 사업 추진	교체시기 도래 시 사업 추진

□ 확인지표

- 전통시장 노후화 아케이드의 현대화

□ 사업개요


- 전통시장 노후 아케이드의 현대화
 - ▶ 대상시장 : 아케이드 설치된 관내 전통시장
 - ▶ 사업비
 - 시설물 유지보수(95,000,000원)
 - ▶ 사업내용: 노후화 아케이드의 지붕막 등을 개선하는 시설현대화 사업

□ 연차별 · 분기별 로드맵


세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
중앙시장 아케이드 지붕막 교체공사																	
아케이드 안전점검																	
중앙시장 아케이드 빗물받이 보수공사																	
현장점검 및 노후시설 개선																	

□ 추진실적

- 2020. 11. 02.: 전통시장(중앙시장) 시설현대화 예산 가내시 통보(도→안양시)
- 2022. 08. 24.: 시설공사과에 공사 설계 및 감독 협조 공문 발송
- 2022. 09. 06.: 아케이드 지붕막 교체공사 설계용역 계약 체결
- 2022. 10. 11.: 전통시장 시설현대화사업 공모 안내
- 2022. 12. 29.: 아케이드 지붕막 교체공사 및 설치 계약 체결
- 2023. 02. 02./03. 09.: 지붕막 교체공사 상인회 사업설명회 개최
- 2023. 03. 22./07. 21.: 중앙시장 아케이드 개폐기 보수
- 2023. 10. 30.: 중앙시장 장내2로 지붕막 교체설치 공사 준공
- 2023. 11. 27.: 중앙시장 장내2로 지붕막 교체공사 준공
- 2023. 12. 15.: 전통시장 아케이드 안전점검 용역 완수
- 2023. 12. 28.: 호계시장 비가림막 설치 사업 특별조정교부금 선정
- 2024. 3. 22.: 중앙시장 아케이드 빗물받이 보수공사 공모 선정
- 2024. 6. 18.: 전통시장 아케이드 기둥 보수공사 착공
- 2024. 7. 15.: 전통시장 아케이드 기둥 보수공사 준공
- 2024. 10. 15.: 중앙시장 아케이드 빗물받이 보수공사 착공
- 2024. 12. 13.: 중앙시장 아케이드 빗물받이 보수공사 준공

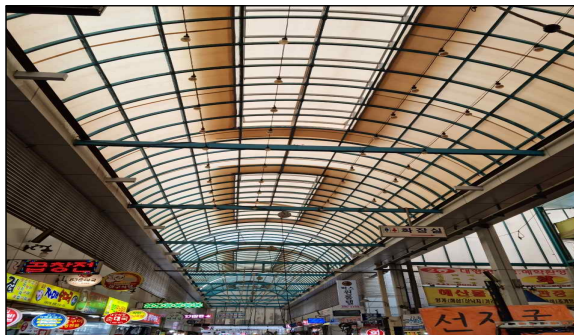

중앙시장 지붕막 교체

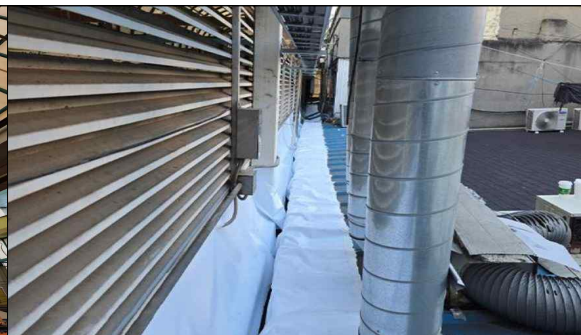

중앙시장 아케이드 빗물받이 보수공사

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 사업설명회를 통해 시, 상인회, 공사업체 간의 의견을 조율하여 상인들의 영업 손실을 최소화하기 위한 공사 방법 강구
(고소작업 크레인 활용한 작업 → 이동식 작업 발판 활용한 작업 대체)

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	2,226	2,131	1,161	1,161	108	108	742	742	120	120	95	0	
도 비	1,095	1,095	539	539	0	0	556	556	0	0	0	0	
시 비	1,077	982	577	577	108	108	177	177	120	120	95	0	
자부담	54	54	45	45	0	0	9	9	0	0	0	0	

※ 아케이드 노후화 및 교체시기 도래 시 예산 확보 추진(경기도 전통시장 시설현대화 공모사업)

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	1,496	92	1,101	243	60	-
도 비	625	12	527	56	30	-
시 비	821	79	530	182	30	-
기 타	50	1	44	5	-	-

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
2	-	1	-	-	30

- ▶ 2020. 7.: 중앙시장 사전컨설팅(시설자문위원)
- ▶ 2022. 1. ~ 8.: 지붕막 교체 자부담금 납부 협의, 설계 협의 등
- ▶ 2023. 2. ~ 3.: 중앙시장 장내2로 아케이드 교체공사 사업설명회(2회)
- ▶ 2024. 1. ~ 8.: 빗물받이 보수공사 자부담금 납부 협의, 설계 협의 등

□ **향후 추진계획**

- 아케이드 교체시기 도래 시 경기도 전통시장 시설현대화 공모사업 신청 예정
