

15-13

임곡3지구 어린이공원내 화장실 설치

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2024년 9월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	공원관리과장 동안공원팀장 주무관	최승갑 정기철 배현석	☎5090 ☎2412 ☎5021	
해당없음				자체						

□ 최종목표

어린이공원내 화장실을 설치하여 공원 이용 시민들의 불편사항 해소 및 쾌적한 공원환경 제공

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
공원조성계획 변경	1식			
주민설명회	1회			
공사 추진		1개소		
완료 후 지속관리		1개소	1개소	1개소

□ 확인지표

- 수명어린이공원내 화장실 1개소 설치

□ 사업개요

- 위치 : 동안구 비산1동 1196 (수명어린이공원)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2024. 8.
- 사업비 : 150백만원
- 사업내용
 - ▶ 기성제품형 화장실 1개소 설치
 - ▶ 화장실 주변 포장 및 수목 정비, 편의시설 이전 설치

□ 연차별 · 분기별 로드맵


세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역 추진																	
주민설명회 및 의견청취																	
공사 착공 및 준공																	
완료 후 지속관리																	

□ 추진실적

- 2022. 9. 19. : 2022년 1차 특별조정교부금 교부 결정
- 2022. 12. 21. : 2022년 제3회 추가경정예산 편성
- 2023. 3. 15. : 실시설계용역 착수
- 2023. 5. 31. : 비산1동 주민설명회 개최
- 2023. 7. 21. : 임곡2차 휴먼시아아파트 입주자 대표 면담
- 2023. 9. 19. : 비산1동 행정복지센터 주관 아파트 입주자대표 간담회 (화장실 관련 의견수렴)
- 2023. 9. 25. : 범죄예방 관련 업무협의 (동안경찰서 생활안전과)
 - ☞ 화장실내 비상벨, 불법촬영탐지시스템 등 범죄예방 시설 협의
- 2023. 10. 26. : 비산1동 행정복지센터 주관 아파트 입주자대표 간담회 (화장실 관련 안전예방대책 대면협의)
- 2023. 12. : 화장실 설치 관련 주민 설문조사 추진
 - ☞ 응답자(167명) 중 76%(127명) 화장실 설치 찬성, 화장실 치안유지 및 청결관리 요청
- 2024. 5. 22. : 주민의견이 반영된 화장실 제작 착수
- 2024. 6. 20. : 화장실 설치를 위한 기반공사 착공
- 2024. 9. 25. : 화장실 설치완료 및 개방



위치도

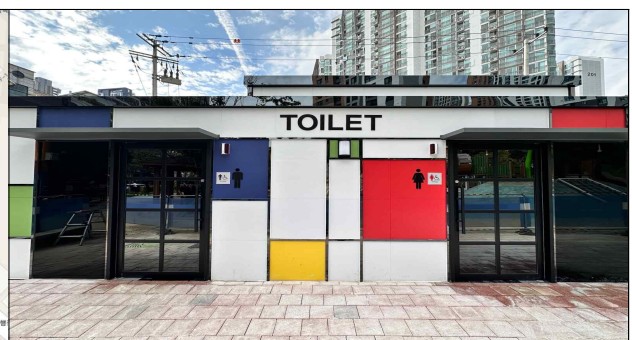

화장실 설치사진

□ **자체 점검결과**

- 화장실 설치 관련 찬성·반대 의견 대립을 해결하고 사업 추진을 위해 인근 아파트 입주자대표회와 회의 진행 등 의견수렴
- 화장실 설치사업 관련 범죄예방에 대한 동안경찰서 생활안전과와 업무 협의 진행

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 특별조정교부금

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	150	-	-	150	-	-
기 타	150	-	-	150	-	-

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
4	-	-	-	-	1 (설문조사)



2023. 5. 31. 비산1동 주민설명회 개최

○ 시민소통 계획

- ▶ 언론보도 및 SNS 소통, 현수막 게시를 통한 적극적인 홍보 추진

□ **향후 추진계획**

- 쾌적한 공원환경 제공을 위한 지속적인 공원유지관리 추진
